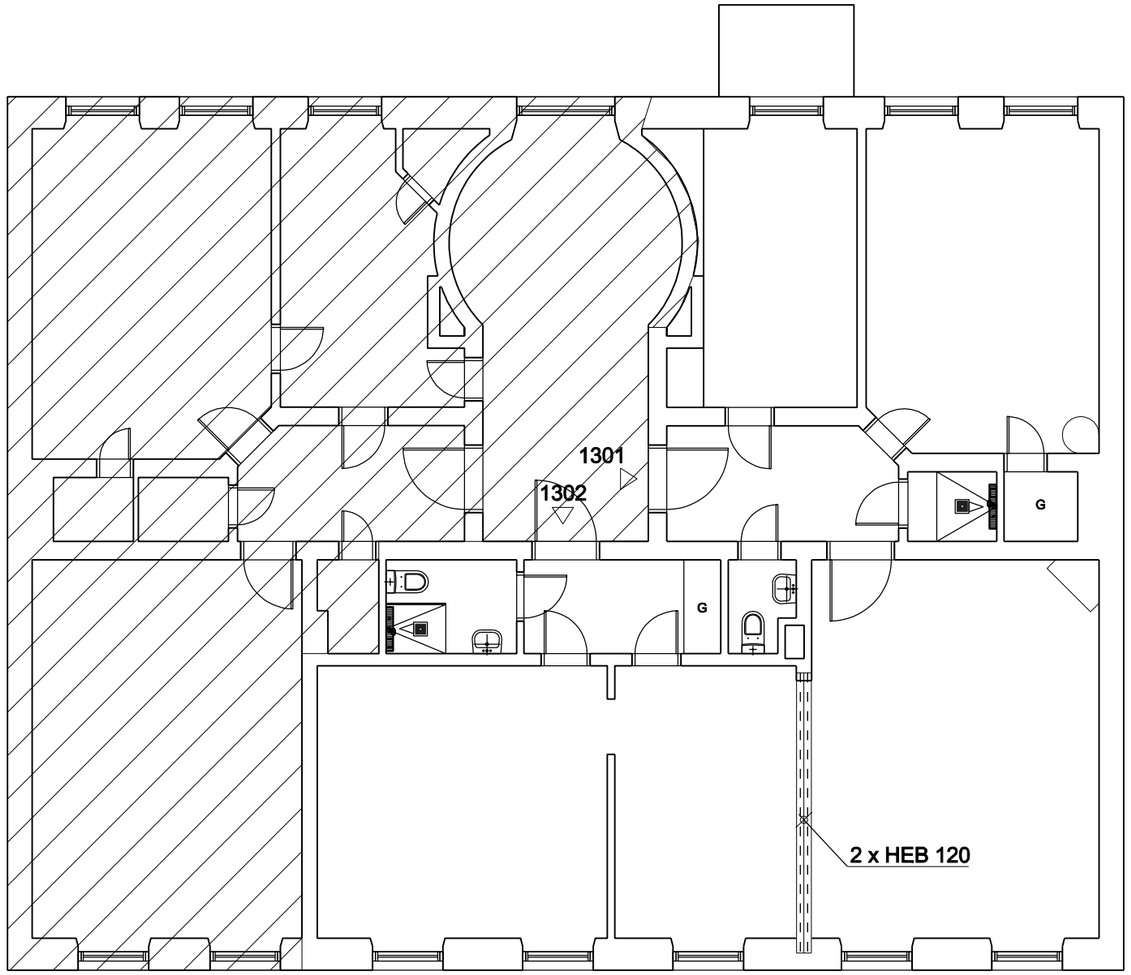


PLAN BEF SKALA 1:100

SKALA 1:100 1m 0 2,5 5m

ARBETSBESKRIVNING

1. OMFATTNING

ARBETENA AVSER ÄNDRING AV BÄRANDE KONSTRUKTION GENOM PARTIELL RIVNING AV BÄRANDE INNERVÄGG SAMT INSTALLATION AV STÅLAVVÄXLING SOM ERSÄTTER DEN RIVNA VÄGGENS BÄRFUNKTION.

ARBETENA SKA UTFÖRAS I ENLIGHET MED FASTSTÄLLDA HANDLINGAR, PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900), BOVERKETS BYGGREGLER (BBR) SAMT EUROKODER MED NATIONELLA VAL (EKS).

2. FÖRBEREDELSER

INNAN ARBETEN PÅBÖRJAS SKA:

- BEFINTLIGA INSTALLATIONER I BERÖRD KONSTRUKTION IDENTIFIERAS OCH SÄKERSTÄLLAS.
- BJÄLKLAG OCH ÖVERLIGGANDE KONSTRUKTION STÄMPAS I ENLIGHET MED FASTSTÄLLDA KONSTRUKTIONSHANDLINGAR.
- ARBETET PLANERAS OCH UTFÖRAS SÅ ATT RISK FÖR SKADA PÅ BYGGNAD OCH PERSONER UNDVIKS.

3. RIVNING

RIVNING AV BÄRANDE INNERVÄGG FÅR ENDAST UTFÖRAS EFTER ATT STÄMPNING UTFÖRTS OCH KONTROLLERATS.

RIVNING SKA SKE KONTROLLERAT OCH STEGVIS. EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN FASTSTÄLLDA HANDLINGAR SKA OMGÅENDE MEDDELAS KONTROLLANSVARIG.

4. STÅLAVVÄXLING

STÅLAVVÄXLING SKA UTFÖRAS I ENLIGHET MED FASTSTÄLLDA KONSTRUKTIONSRITNINGAR.

STÅLBALKAR SKA MONTERAS MED FÖRESKRIVEN UPPLAGSLÄNGD OCH UTFÖRDA INFÄSTNINGAR. LASTÖVERFÖRING TILL KVARVARANDE BÄRANDE KONSTRUKTION SKA SÄKERSTÄLLAS.

STÄMPNING FÅR INTE AVLÄGSNAS FÖRRÄN AVVÄXLINGEN ÄR FULLT INSTALLERAD OCH KONTROLLERAD.

5. BRANDSKYDD

STÅLBÄRVERK SKA BRANDSKYDDAS I ENLIGHET MED KRAV I BOVERKETS BYGGREGLER.

BRANDTEKNISKT UTFÖRANDE SKA ÖVERENSSTÄMMA MED FASTSTÄLLDA HANDLINGAR.

6. ÅTERSTÄLLANDE

EFTER SLUTFÖRDA KONSTRUKTIONSARBETEN SKA BERÖRDA BYGGNADSDELAR ÅTERSTÄLLAS.

BRAND- OCH LJUDKRAV SKA UPPFYLLAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE BESTÄMMELSER.

7. KONTROLL

ARBETENA SKA KONTROLLERAS I ENLIGHET MED FASTSTÄLLD KONTROLLPLAN.

UTFÖRANDEKONTROLL ENLIGT EKS 10 KAP. §27 SKA GENOMFÖRAS. ENTREPRENÖRENS EGENKONTROLLER SKA DOKUMENTERAS.

8. SLUT

ARBETENA SKA UTFÖRAS SÅ ATT BYGGNADENS BÄRFÖRMÅGA, STADGA OCH BESTÄNDIGHET SÄKERSTÄLLS.

BEDÖMNING

DEN FÖRESLAGNA ÅTGÄRDEN BEDÖMS KUNNA GENOMFÖRAS UTAN NEGATIV PÅVERKAN PÅ BYGGNADENS GLOBALA STABILITET FÖRUTSATT ATT ARBETENA UTFÖRS I ENLIGHET MED FASTSTÄLLDA HANDLINGAR.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGLOVSRITNING

FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN
SAMMANSLAGNING AV LÄGENHET 1301 &1302 ROSLAGSGATAN 35, GATUHUSET

A | Aleksandar Carapic | Tel: 073-634 34 76
Civilingenjör/Konstruktör
Erikas väg 14, 153 38 Järna
aleksandar.carapic@gmail.com

RITAD/KONSTR AV: Aleksandar Carapic

DATUM: 2026-02-24 | ANSVARIG: Aleksandar Carapic

RITNINGENS INNEHÅLL:
BESKRIVNING AVVÄXLING PLAN BEF

SKALA: 1:100/A3 | RITNINGSNR: K-30-03 | BET:

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-02-25, Dnr 2026-02453
